ANNEXE 16 : CALENDRIER DE REALISATION

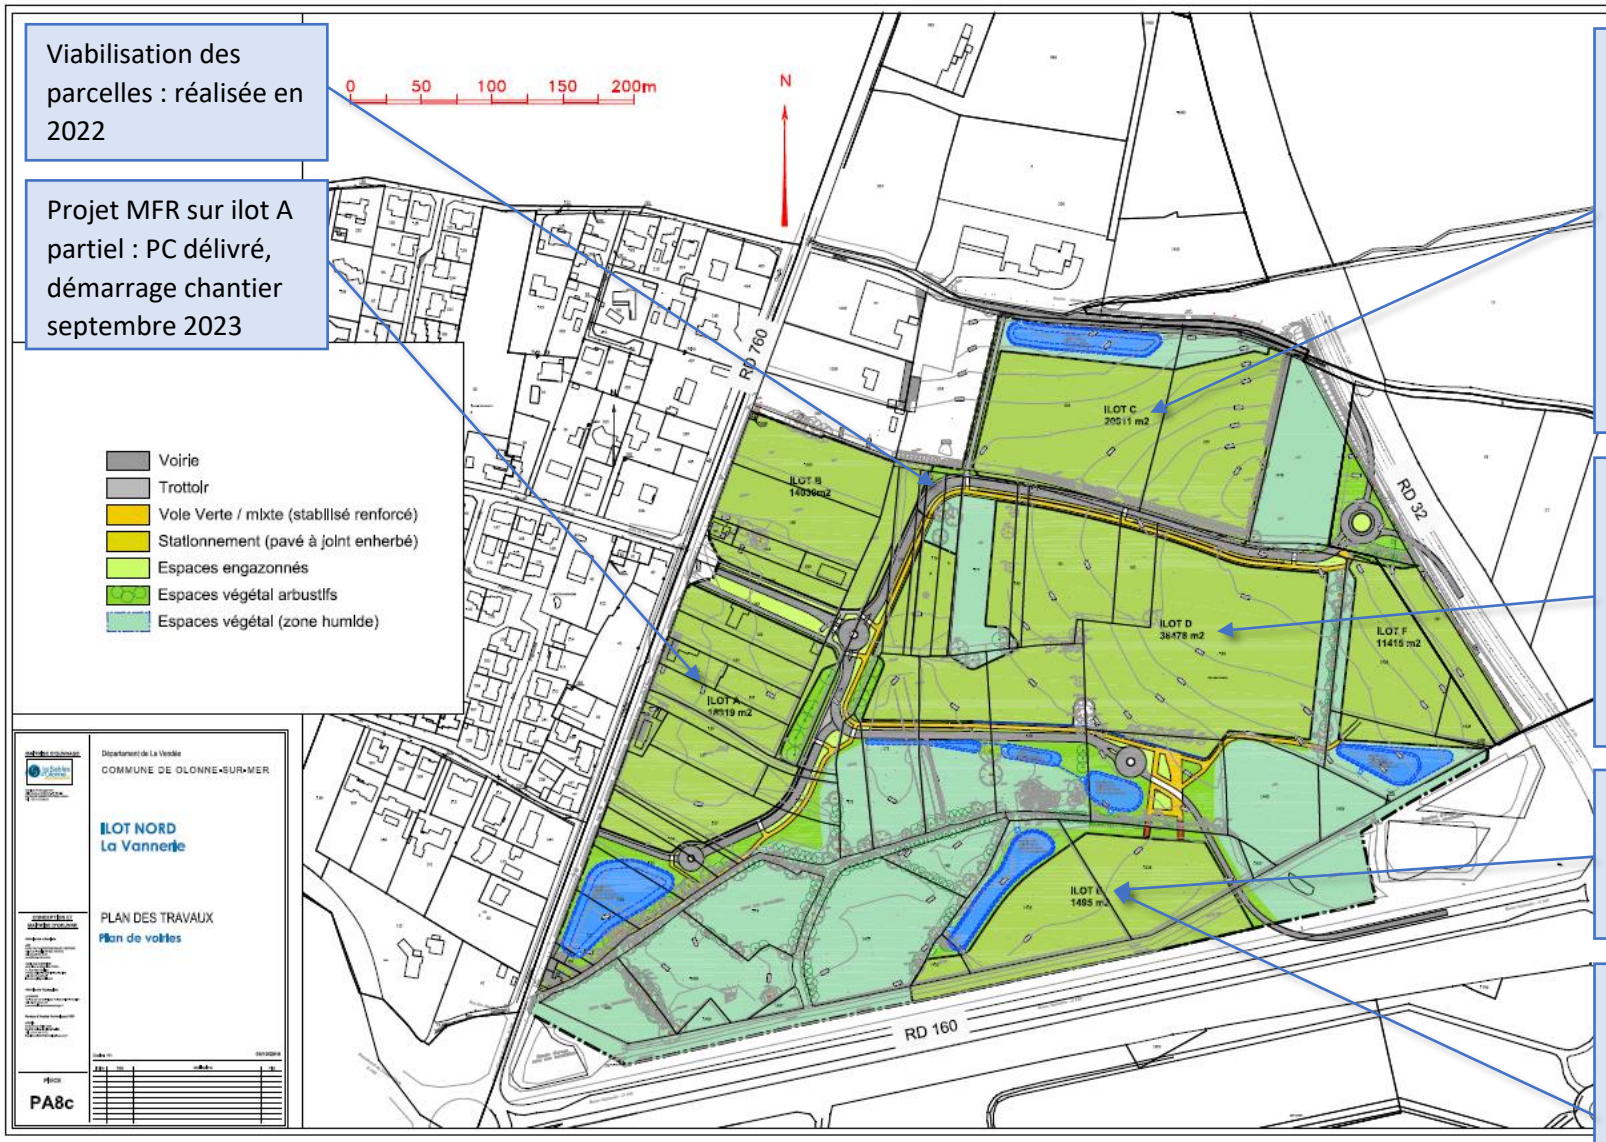

Viabilisation des parcelles : réalisée en 2022

Projet MFR sur ilot A partiel : PC délivré, démarrage chantier septembre 2023

Parking silo sur ilot C (800 places en ouvrage + aire événementielle) : en étude, PC déposé, Cas par Cas déposé, mise en chantier prévue pour 2024 pour un achèvement 1T2025

Halle sportive et culturelle (ARENA) sur ilot D : PC délivré, mise en chantier en mai 2023, achèvement prévu en septembre 2025

Station H2 sur ilot E partiel : achevée, inaugurée en juin 2023

Parking silo sur ilot E partiel (600 places en ouvrage) : en étude, mise en chantier prévue pour 2024 pour un achèvement 3T2025
